





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# ENERO 2020



**DEPENDENCIA:** H. AYTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA

**SECCION:** OBRA PÚBLICA

**OFICIO No:** OP-027/2020

**ASUNTO:** REPORTE MES DE ENERO

Gutiérrez Zamora, Ver. 24 de Febrero 2020.

**DIP. RUBEN RIOS URIBE**  
**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**  
**LXV LEGISLATURA DEL ESTADO**  
**XALAPA, VERACRUZ.**  
**P R E S E N T E :**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Enero 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
**Presidente Municipal Constitucional**



**DEPENDENCIA:** H. AYTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA

**SECCION:** OBRA PÚBLICA

**OFICIO No:** OP-028/2020

**ASUNTO:** REPORTE MES DE ENERO

Gutiérrez Zamora, Ver. 24 de Febrero 2020.

**MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS**  
**AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO**  
**DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.**  
**P R E S E N T E :**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Enero 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
**Presidente Municipal Constitucional**





ACTA NUMERO **11** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

  
SINDICA  
ÚNICA

  
REGIDOR  
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

  
REGIDORA  
SEGUNDA

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.-----

  
REGIDOR  
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020, FORTAMUN DF 2020, CAPUFE 2019, REC FISC 2020. -----

  
REGIDORA  
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

  
SECRETARIO F  
AYUNTAMIENT

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----**

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- -----**

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de enero de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que



fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de enero del año 2020.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del año 2020. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020, FORTAMUN DF 2020, CAPUFE 2019, REC FISC 2020. - - - - -**

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de enero de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FORTAMUN DF 2020 no se presenta movimientos de obra durante el mes y de CAPUFE 2019, FISM DF 2020, REC FISC 2020. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de enero del año 2020; de los reportes de los fondos del FISM DF 2020, FORTAMUN DF 2020, CAPUFE 2019, REC FISC 2020.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de enero del año 2020, de los reportes de los fondos del FISM DF 2020, FORTAMUN DF 2020, CAPUFE 2019, REC FISC 2020. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**6.- ASUNTOS GENERALES. - - - - -**


No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Décima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

**7.- CLAUSURA. - - - - -**

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SINDICA ÚNICA

  
REGIDOR PRIMERO

  
REGIDORA SEGUNDA

  
REGIDOR TERCERO

  
REGIDORA CUARTA

  
SECRETARIO F  
AYUNTAMIENT





AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

C.   
WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
**SÍNDICA**

C.   
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA PRIMERA

C.   
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
REGIDOR PRIMERO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA SEGUNDA

C.   
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA TERCERA

C.   
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA  
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
REGIDURIA CUARTA

C.   
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
**SECRETARÍA**

C.   
JORGE CHENA BATRES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**DEPENDENCIA:** H. AYTTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
**SECCION:** OBRAS PÚBLICAS  
**OFICIO No:** 2020-02-19/026  
**ASUNTO:** NO EJECUCIÓN DE OBRA

Gutiérrez Zamora, Ver., a 17 de febrero de 2020.

**DIP. RUBEN RIOS URIBE**  
**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**  
**LXV LEGISLATURA DEL ESTADO**  
**XALAPA, VERACRUZ.**  
**P R E S E N T E :**

El que suscribe **Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga**, Director de Obras Públicas en el Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; **Hago constar que en relación a los Fondos del Ramo 033 en particular del FIS MDF 2020 Y FORTAMUNDF 2020**, no se tiene ejecución de pago alguno por Obras en el mes de Enero ya que se encuentra en proceso de integración del respectivo PGI 2020.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**





Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56031

Número Obra	Descripción
Formato 09H	Formato 09V
Formato 11	Formato 12

EMO120201G09ZAMORA56031

# SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.



SELLO DIGITAL:

xtfS4NhSu7uTd25KyrGzhUpGe/NEcNGXk8mi2ThIMRX7xk1aQFhDhP5xbQgXLYDmXAIAGr1PxtJfgFBXnXAf09KRI7CW88Yk3MYcVwVMINAUjDiyNizypRN3RsmVmf27g1N3EppW3ND765mAk+y7J3Xa35yCf64hjHwLOk=





Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56032

Número Obra	Descripción	Formato 09H Formato 09V Formato 11 Formato 12
-------------	-------------	---

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56032

# SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.





Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56326

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	No	No	No	No
2020300690452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2020300690455	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUJOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.	Sí	No	Sí	No
2020300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	Sí	No	Sí	No



GOBIERNO  
ESTADUAL  
DE ZAMORA  
MICH  
SECRETARÍA DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56326

SELLO DIGITAL:

aBFwVWz58/Qv/Lxs53y9bv/ja7GCellQ7YJghbWS13/AfuPrezNxiRwHIOvqWpUKA8FptF9Qv8xvSaB0M+MhZKkHu1UJUKRZC0aGROJmFB9cKvHuTncG46/1JZAS5DoBm5le2MiqW+16NHu8U886620oVFkva9ZcnwExrEnbf8=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56307

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	No	No	No	No
2019300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56307



GOBIERNO  
 FEDERAL  
 SECRETARÍA DE  
 OBRAS  
 PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

Lm5umPEmFqIjVx85U5/G7P6ebsqz0hYFuQ9NBxKQA|plWIEzjH10+TEcfq2fokOYpgr965aWmZ5curDRL0CCSAM500A4d+RV53mY0VWWPFC/4YlQT5IKR9MxKafGqVm9QJau4BgVnI3mVGSnRAucb4L4w6mjwMLEwlg00RcVxk=





Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56340

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690001	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/56340



SELLO DIGITAL:

FglvQoJrmRzPxPGenZnaHN2M43PkUM2FljQPc/KQ2NWaKRÀopEVDetoHjnNP+WkP7LAZ8/+tc+dKWJsn1YFUCBWE/n5ycGHEz3FOdM/3uQ/YhpWDd7dhP6APZJRh73r52WjnbM5UAYi4uBUmZ+hoO/u91QDr79ctcPGFfKI=

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA      Localidad: SAN ANTONIO CORONADO      Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2020  
 No. de obra: 2019300690457.00      Periodo: ENERO      Número de estimación: 5.00  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL      Fuente de financiamiento: CAMINOS Y PUENTES FEC  
 BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583      Fecha de revisión: 03/02/2020


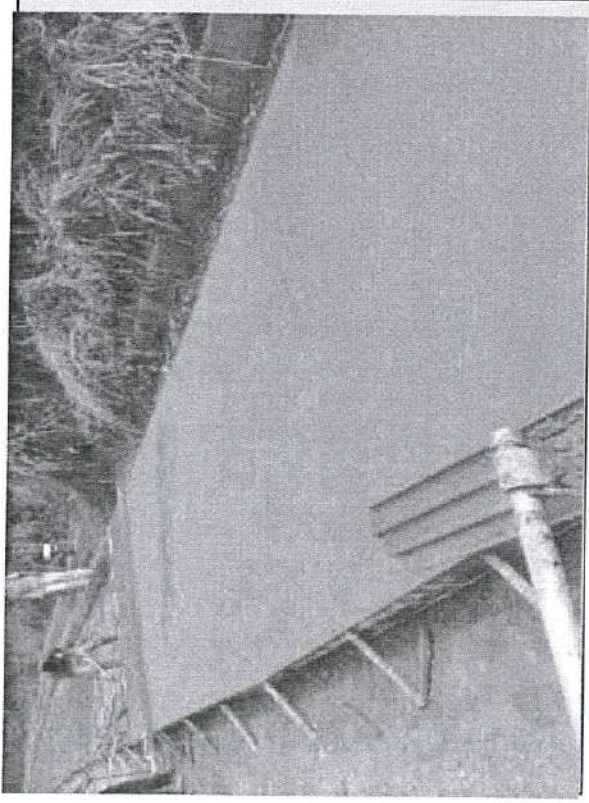


FOTO PAVIMENTO

Concepto de obra ejecutado:

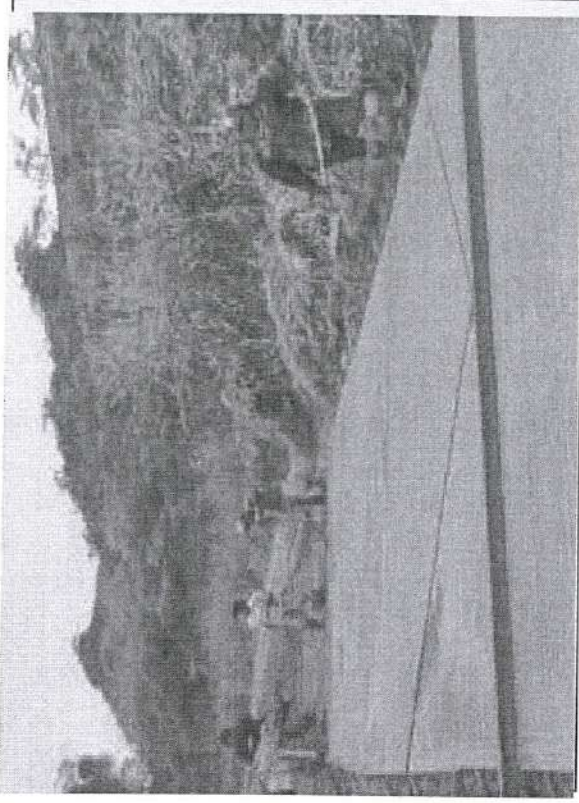

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

POR FINIQUITAR

RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
 Supervisor de obra Responsable

INGENIERO  
 Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orffis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.


## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2020  
**No. de obra:** 2020300690455.00      **Número de estimación:** 3.00  
**Descripción:** REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUITOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.      **Fuente de financiamiento:** MINOS Y PUENTES FEDERAL  
**Fecha de revisión:** 03/02/2020

**Localidad:** IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL)

**Periodo:** ENERO

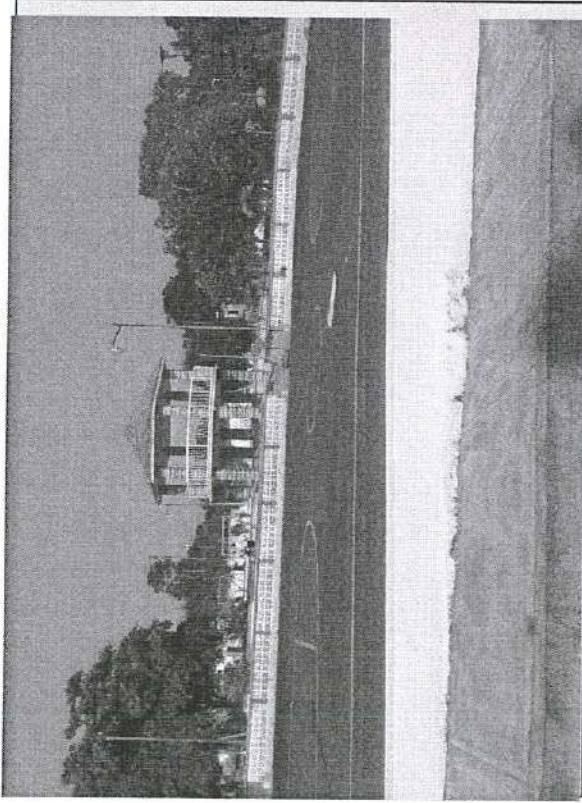

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

TERMINADO

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO**



AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2019-2021  
**OBRAS  
 PÚBLICAS**

**Observaciones:**


TERMINADO

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS

**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**  
 c.c.p. Presidente Municipal  
 c.c.p. Contralor Interno  
 c.c.p. Tesorero Municipal  
 c.c.p. Director de Obras Públicas  
 c.c.p. Orfis






# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES


**Municipio:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Localidad:** SAN ANTONIO CORONADO      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2020  
**No. de obra:** 2020300690457.00      **Periodo:** ENERO      **Número de estimación:** 5.00  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL      **Fuente de financiamiento:** MINOS Y PUENTES FEDERAL  
**BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583**      **Fecha de revisión:** 03/02/2020

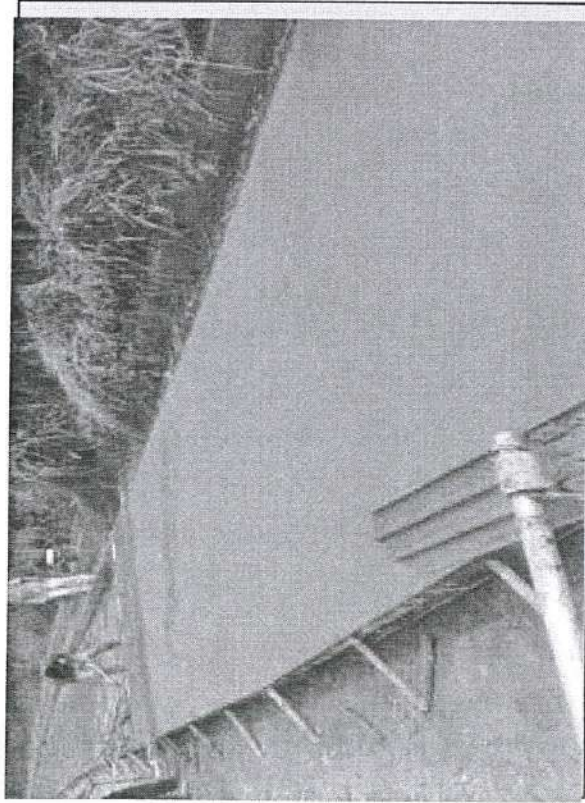

**FOTO**  
PAVIMENTO

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

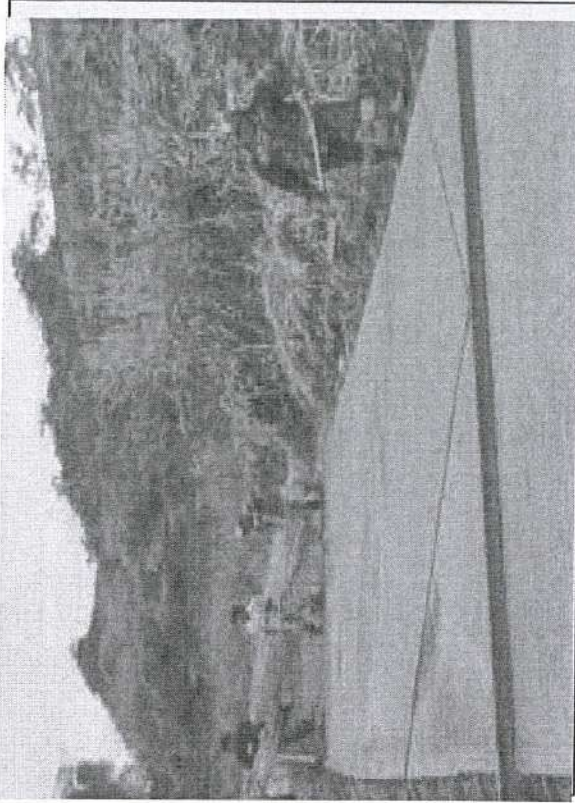

**FOTO**



AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUBERNAMENTAL  
 2010-2021  
**OBRAS  
 PÚBLICAS**

**Observaciones:**

TERMINADO

**Supervisor de obra Responsable**  
 RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA

**Profesión del Supervisor**  
 INGENIERO

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2020  
**No. de obra:** 2019300690001      **Periodo:** ENERO      **Número de estimación:** 1.00  
**Descripción:** REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA      **Fuente de financiamiento:** RECURSOS FISCALES  
**Fecha de revisión:** 03/02/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Observaciones:

TERMINADO



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021

*[Handwritten Signature]*  
RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: SAN ANTONIO CORONADO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO CAMINOS Y PNO. DE OBRA: 2019300690457  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: BARRILES- CORONADO KM 04-000 AL 04-583

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**  
 CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO  
 TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: RURAL URBANA N/A  
 ZONA: URBANA N/A  
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X  
 SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO  
 CLAVE: N/A  
 AGEB: SI NO X  
 TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA X  
 RESTRICTIDA  
 GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO  
 ANTECEDENTES: DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRICTIDA

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***  
 COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: 20.44124442 LONGITUD -97.125747693

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		MONTO	No.	No.	IMPORTE OBRA POR ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTO								
ESTIMACIÓN 5	\$323,400.00	5	\$323,400.00	1000409674	5324,800.00	50.00	\$1,400.00	50.00	\$323,400.00	\$0.00	\$323,400.00
ESTIMACIÓN 4	\$373,981.03	5	\$373,981.03	0000409674	\$375,600.00	50.00	\$1,618.97	50.00	\$373,981.03	50.00	\$373,981.03
ESTIMACIÓN 2	\$311,850.00	2	\$311,850.00	403288748	\$313,200.00	50.00	\$1,350.00	50.00	\$311,850.00	50.00	\$311,850.00
ESTIMACIÓN 1	\$311,850.00	1	\$311,850.00	409674180	\$313,200.00	50.00	\$1,350.00	50.00	\$311,850.00	50.00	\$311,850.00
ESTIMACIÓN 3	\$404,250.00	3	\$404,250.00	0000409674	\$406,000.00	50.00	\$1,750.00	50.00	\$404,250.00	50.00	\$404,250.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,725,331.03</b>		<b>\$1,725,331.03</b>		<b>\$1,732,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,468.97</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,725,331.03</b>

**B) REPORTE**

EXISTE	FECHAS
\$700,400.00	22/01/2020
\$1,732,800.00	22/01/2020
\$0.00	

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**DEFECCIONES:**

MONTO PAGADO EN EL MES: \$700,400.00  
 MONTO PAGADO ACUMULADO: \$1,732,800.00  
 FINQUITO CON IVA: \$0.00  
 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2020  
 MES QUE SE REPORTA: ENERO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
 EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 04-000 AL 04-583  
 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
 EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 04-000 AL 04-583  
 COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO  
 EXCAVACIÓN EN LA ABERTURA DE CALA EN TERRACERAS, CARGA DE MATERIALES, ACIME Y DE CURACRETO  
 COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO  
 EXCAVACIÓN EN LA ABERTURA DE CALA EN TERRACERAS, CARGA DE MATERIALES, ACIME Y DE CURACRETO

MONTO AUTORIZADO: \$1,750,707.80  
 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$3,500,000.00  
 VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA C/IVA X  
 DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
 FACTIBILIDAD: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
 PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
 DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X  
 LOS PERMISOS: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE  
 LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: MGZ-CAPUFE 2019/0457/OP-007 FECHA: 11/11/2019  
 CONTRATISTA: RICANO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.  
 RFC: RHC041126903  
 MONTO CONTRATADO: \$3,500,000.00  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02/01/2020 REAL  
 TERMINO 31/03/2020 13/11/2019  
 DÍAS 29 27/12/2019  
 APLICA 29 NO APLICA 45  
 MONTO: NO APLICA X  
 FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: X

TIPO DE FIANZAS: ANTI-CIPI  
 MONTO FIANZAS: \$301,724.14  
 APTAZADORA: Fianzas Dorama, S.A  
 NO. DE FIANZA: 18A86906  
 FECHA: 11/11/2019  
 CONVENIO: EXISTE  
 MODIFICATORIO: MONTO INICIAL FINAL  
 PLAZO: 02/01/2020 02/01/2020  
 MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$3,500,000.00 C/IVA

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
 SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:	03/02/2020
MES QUE SE REPORTA	ENERO

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: IGNACIO MUNOZ (ZAPOTAL) DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE IGNACIO MUNOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDERNO. DE OBRA: 20203000690455 A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

ANTECEDENTES:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: RURAL URBANA N/A

ZONA: SI X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP. SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

DIRECTA X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -97.164717000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS		IMPORTE NETO	
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	5 MILLAR	IMPORTE NETO
STIMACION 3 FI	\$48,099.15	3	\$48,307.37	\$208.22	\$48,099.15
TOTALES	\$48,099.15		\$48,307.37	\$0.00	\$48,099.15

NO. DE CONTRATO: MGZ-CAPUFE 2019/0455/OP-004 FECHA: 02/01/2020

CONTRATISTA: EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA SA DE CV

RF: EAP150625319

MONTO CONTRATADO: \$48,307.37

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 18/02/2020 TERCER DIA 31/03/2020

ANTICIPO: APLICA MONTOS: 0 NO APLICA PORCENTAJE: X

FECHA DE PAGO: EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA LICITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL													
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS	AVANCE												
\$48,307.37	SI	08/01/2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
\$48,307.37	SI	08/01/2020	PROGRAMADO REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$0.00	SI		ACUMULADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SI		ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$48,307.37

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECUOSA DIRECTOR DE OBRAS

LEONEL RODRIGUEZ RIOS SUPERVISOR

FORMATO 1.1

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: SAN ANTONIO CORONADO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDERNO. DE OBRA: 2020300690457 BARRILES: CORONADO KM 0+000 AL 0+583

FECHA DE ELABORACION: 03/02/2020  
 MES QUE SE REPORTA: ENERO

**ANTECEDENTES:**  
 CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI  NO   
 OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A ZONA: URBANA AGEB: SI  NO   
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI  NO   
 SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA  
 COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -97.125747693 LATITUD 20.441244142

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (MFTA) DE LA OBRA:**  
 CAVACION EN PERTONAS DE CALA EN TERRACERIAS; CARGO DE MATERIALES; APORTE Y COMPACTACION DE SUB-BASE; CIMBRA EN FRONTERA; PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACION, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACION DE CURACRETO.  
 EXCAVACION EN LA DEBILIDA DE CALA EN TERRACERIAS; CARGA DE MATERIALES; AGRIE V.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
 CAVACION EN PERTONAS DE CALA EN TERRACERIAS; CARGO DE MATERIALES; APORTE Y COMPACTACION DE SUB-BASE; CIMBRA EN FRONTERA; PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACION, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACION DE CURACRETO.  
 EXCAVACION EN LA DEBILIDA DE CALA EN TERRACERIAS; CARGA DE MATERIALES; AGRIE V.

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTOS CON IVA	POLIZAS CHEQUE	MONTOS		IMPORTE OBRAS ESTIMADO	IMPORTE OBRAS ESTIMADO	AVORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
			No.	Monto						
ESTIMACION 5	\$323,400.00	5	\$323,400.00	\$0.00	\$323,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$323,400.00	
ESTIMACION 4	\$373,981.03	4	\$373,981.03	\$0.00	\$373,981.03	\$0.00	\$1,618.97	\$0.00	\$373,981.03	
<b>TOTALES</b>	<b>\$697,381.03</b>		<b>\$697,381.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$697,381.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,018.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$697,381.03</b>	

**MONTO AUTORIZADO:** \$1,195,297.86  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$1,195,297.86  
**VALIDACION DEL PROYECTO:** EXISTE  
**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** NO EXISTE  
**FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:** EXISTE  
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:** NO EXISTE  
**FACTIBILIDAD:** NO EXISTE  
**PERMISOS Y CONCESIONES:** EXISTE  
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:** NO EXISTE  
**TIPO DE LICITACION:** ADJUDICACION DIRECTA  
**INVTACION A MENOS 3 PERSONAS:** EXISTE  
**LICTACION PUBLICA:** X

**NO. DE CONTRATO:** MGZ-CAPUFE 2019/0457/OP-007  
**FECHA:** 11/11/2019  
**CONTRATISTA:** RICAÑO HUDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV  
**RF:** RHC0411289C3  
**MONTO CONTRATADO:** \$1,195,297.00  
**PROGRAMADA REAL:** C/IVA  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** INICIO 18/02/2020 TÉRMINO 02/01/2020  
**DIAS:** 31/03/2020  
**APLICA:** 43  
**NO APLICA:** 0  
**MONTO:** NO APLICA  
**FECHA DE PAGO:** PORCENTAJE: X

**B) REPORTE**

MONTOS	EXISTE	FECHAS												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MONTOS PAGADO EN EL MES:	\$700,400.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTOS PAGADO ACUMULADO:	\$700,400.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINQUITO CON IVA:	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TIPO DE FIANZA:** ANTICIPO  
**MONTO AFIANZADO:** \$301,724.14  
**AFIANZADORA:** Fianzas Dorama, S.A.  
**No. DE FIANZA:** 18487025A  
**FECHA:** 27/11/2019  
**CONVENIO MODIFICATORIO:** MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO  
 PLAZO INICIAL FINAL  
 02/01/2020 31/03/2020  
**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO MODIFICATORIO):** \$1,195,297.00  
**CONTRATO DE OBRA:** C/IVA

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
 RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA SUPERVISOR  
 FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el aplicativo de estado financiero utilizar otros hojas.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:	03/02/2020
MES QUE SE REPORTA	ENERO

**MUNICIPIO:** GUTIERREZ ZAMORA **LOCALIDAD:** GUTIERREZ ZAMORA **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** REHABILITACION DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RECURSOS FISCALES **No. DE OBRA:** 2020300690001

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

**ANTECEDENTES:** SI X NO

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI X NO

**TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:** CLAVE: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAO X

**ZONA:** RURAL URBANA N/A

**AGEB:** SI X NO X

**SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:** SI X NO

**SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:** SI X NO

**TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:** COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

**COORDENADAS DE GEORREFERENCIA**  
LONGITUD: 20.447607000 LATITUD: -97.0898846000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
TUSCU Y REVENIDA Y RECONSTRUCCION DE TERRENO PARA DESPACHAR DE ESTRUCTURAS,  
DEMOLICION A MANO DE LAVADEROS DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO  
HIDRAULICO SIMPLE; GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE FC= 150  
KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", 15X20X50 DE SECCION CON VOLTEADOR; LAVADERO  
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TRAZO Y REVENIDA Y RECONSTRUCCION DE TERRENO PARA DESPACHAR DE ESTRUCTURAS,  
DEMOLICION A MANO DE LAVADEROS DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO  
HIDRAULICO SIMPLE; GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE FC= 150  
KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", 15X20X50 DE SECCION CON VOLTEADOR; LAVADERO  
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE

MONTO AUTORIZADO:	\$300,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$300,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE	NO APLICA
FACIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACIBILIDAD:	NO EXISTE	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	NO EXISTE	NO APLICA
<b>TIPO DE LICITACION:</b>	ADJUDICACION DIRECTA EXISTE X LICITACION A MENOS DE 3 PERSONAS X LICITACION PUBLICA	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-RF2020/0001/OP-001	<b>FECHA:</b>	08/01/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	RICAMO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
<b>RFC:</b>	RHC0411269Q3		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$300,000.00	<b>C/IVA</b>	
	PROGRAMADA		REAL
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	INICIO	16/01/2020	09/01/2020
	TERMINO	31/01/2020	15/01/2020
	DÍAS	16	7
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	MONTO:	NO APLICA
		FECHA DE PAGO:	PORCENTAJE:

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$300,000.00		\$30,000.00
<b>AFIANZADORA:</b>	Ricamo Huidobro Construcciones SA de CV, Grupo Pifa, S.A. de CV, Grupo Pifa, S.A. de CV, Grupo Pifa		
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-02999-7		3900-03003-0
<b>FECHA:</b>	08/01/2020	<b>IMPORTE/PERIODO</b>	18/01/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	EXISTE	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>
		<b>PLAZO</b>	
		<b>NO APLICA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO MODIFICATORIO):</b>	\$300,000.00		C/IVA

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS  
SUPERVISOR

FORMATO 11

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	INORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	APORTIZADO CON IVA	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO	AVANCE FÍSICO REAL														
									MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
ESTIMACION 1	\$298,706.00	1	\$298,706.90	0000403258	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$298,706.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	\$298,706.00		\$298,706.90		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$298,706.90														

**B) REPORTE**

<b>EXISTE</b>	<b>FECHAS</b>	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$300,000.00	15/01/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$300,000.00	15/01/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

**OBSERVACIONES:**

En caso de requerir más filas, en el apartado de estado financiero utilizar otro hoja.



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /56326

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/02/2020 06:13:28 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

aBFwVWzS8JQv/LxxS3y9bv/ja7GCellQ7YJGhbWSI3/AfuPreZNxIRwHIOvqWpUKA8FpttF9Qv8xvSaB0M+MhZKHu1UFUIkRZC0aGRQJmFB9oKvHuTNcG46/IJ2A5DoBm5le2MlqIW+t6NHu8U886d2OoVFkva9ZcnwExrEnbf8=



**EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS**

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /56307

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/02/2020 06:14:58 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Lm6umPEMFqlxVxB5U5/G7P6ebsqz0hYFuQ9NBxKQAipIWEzj+hI0+TEcfq2fokOYpgn96SaWmZ5cwrDRL0  
cCSAMS00A4d+RVS3MyOWWPfC/4YIQt5IkR9MxKoflGqVm9QJaU4BgVnJ3mVG5nRAucb4L4w6mjwMLE  
wlg0ORCvxck=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /56032

C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/02/2020 05:36:40 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

m9zRMuEYx0zMVmIL4bedQC+8+Ox1EQXvy19WtsirbGJlYnOlUG2k9mOsxQ9KFS/NtsEAvbH9k7Hw5/IPQRfxDG4Cb0WaOVg1otERCqzt0idu7GXyt98HEOyXEU/oOe1W8ja8SSyB5zRiRnuwGm8K6LibpwsKMyGibcCSwLjq/s=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /56031

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/02/2020 05:38:29 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

xtfS4NhSu7uTd25KydrGZhUpGe/NEcNGXk8mi2ThIMRX7xk1aQFhDhP5xbQgxLyDmXAIa6r1PxtJfgFXBxnXAf09KRI7CW8BYIk3MYcVwVMINAujiDiyNizypRN3RsmVmf27g1N3EppW3ND765mAk+y7J3lXa35yCf64hjHwL0k=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /56340

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/02/2020 07:08:58 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

FglvQojrmRzPxPGenZnaHN2M43PkUM2FLiQPc/KQ2NwaKRAopEvDetoHjnNP+WkP7LAZ8/+tc+dKWJsn  
1YFUCBWE/n5ycGHtEz3FOdM/3uQ/YhpWDd7dhP6APZjRh73r52WjnbM5UAYil4uBUmtZ+hoO/u91QDr79  
ctcPGFcFKI=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*
