



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2016-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREEER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

MARZO 2020




DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2020/24/04-0158
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Marzo 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 24 de Abril de 2020.
A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIERREZ ZAMORA.





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2020/24/04-0157
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. RUBEN RIOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Marzo 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 24 de Abril de 2020.
A T E N T A M E N T E



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIERREZ ZAMORA.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER
2018 - 2021
PRESIDENCIA

ACTA NÚMERO **20** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Síndica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----


PRESIDENTE MUNICIPAL


SÍNDICA ÚNICA


REGIDOR PRIMERO

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.**-----

REGIDORA SEGUNDA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----


REGIDOR TERCERO


REGIDORA CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edificio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - **ACUERDO APROBADO POR MAYORÍA.** -----


SECRETARIO AYUNTAMIENTO

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. ----- En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de marzo de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería



Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de marzo del año 2020.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes **de marzo** del año **2020. APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA).-----

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de marzo de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos a los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de marzo del año 2020; FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA).-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de **marzo** del año **2020**, de los reportes de los fondos de los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

6.- ASUNTOS GENERALES.-----



PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA ÚNICA



REGIDOR PRIMERO

REGIDORA SEGUNDA



REGIDOR TERCERO



REGIDORA CUARTA



SECRETARIO F AYUNTAMIENTO



No hubo asuntos generales. -----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Vigésima Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS**, DEL DÍA **QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SÍNDICA

C. 
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

Ausencia temporal por acuerdo de cabildo tomado el 13/03/20 en acta No. 16 extraordinaria a solicitud escrita; con fundamento en el Art. 24 de Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C. _____
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA


C. 
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C. 
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA PRIMERA



C. 
FRANCISCO HATZE GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA TERCERA


C. 
JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SECRETARIA



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57824

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690001	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

VoqApNep1xMs/yFMnTorHbAjR3Iz7o1GeeJmSMIK4cWQnmmOXEAstLFqrcDaFA9XJH9LvLzzB+U+9pVbXG6nNO56LmX6fU/zjgw1aWei6cHPnhg1TT1+N8L3+FIPZdrIYUWSE3r07nCEYf9msRTVQ/ObpDllooOUKCD4DIMXWDA=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57942

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	Sí	No	Sí	No
2020300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO	No	No	No	No
2020300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO	No	No	No	No
2020300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	No	No	No	No
2020300690105	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COL. ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2020300690106	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No
2020300690107	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690108	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30SBC2127H, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2020300690109	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

Y6mYVU6bCY7aNX9RE0RMJy5+vNe/wLL7009qnIYy97O2u1s1r5SQ7aDJvsvYqcfG8isBkb8Ga3gC3tWeZ0ewmMrbcqRZg740vrNa5JqddMLoezFuyXVYhFwcOhJuzY9ii7HHLrc2FkPa7topXnGlsxRFuEwTMGmrUg2ssdiNzsU=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57942

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690110	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA HDZ. Y HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690111	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	Sí	No	No	No
2020300690112	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS	No	No	No	No
2020300690113	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON , COLONIA CUAHUTLAN	No	No	No	No
2020300690115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO , COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

Y6mYVU6bCY7aNX9RE0RMJy5+vNe/wLL7009qnIYy97O2u1s1r5SQ7aDjvsyVqcFg8is8kb8Ga3gC3tWeZ0ewmMrbcqRZg740vrNa5JqddMLoezFuyXVYhFwcOhJuzY9ii7HHLrc2FkPa7topXnGlsxRFuEwTMGmrUg2ssdiNzsU=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57942

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL ENTRE CALLES CAOBA Y EUCALIPTO, CALLE CAOBA ENTRE PRIVADA NOGAL Y JACARANDAS, EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	Sí	No	No	No
2020300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+300 AL 0 + 883.	No	No	No	No
2020300690118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+884 AL 0 + 1+410	No	No	No	No
2020300690119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALENZUELA DEL KM 0+300 AL 0 + 855	No	No	No	No
2020300690120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE BENAJAMENTO	No	No	No	No
2020300690121	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690122	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690123	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

Y6mYVU6bCY7aNX9RE0RMJy5+vNe/wLL7009qnlYy9702u1s1r5SQ7aDJvsyVqcfG8isBkb8Ga3gC3tWeZ0ewmMrbcqRZg740vrNa5JqddMLoezFuyXVYhFwcOhJuzY9ii7HHLrc2FkPa7topXnGlsxRFuEwTMGmrUg2ssdiNzsU=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57942

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690124	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	No	No	No	No
2020300690125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57942



SELLO DIGITAL:

Y6mYVU6bCY7aNX9RE0RMJy5+vNe/wLL7009qnlYy97O2u1s1r5SQ7aDjvsyVqcfG8isBkb8Ga3gC3tWeZ0ewmMrbcqRZg740vrNa5JqddMLoezFuyXVYhFwcOhJuzY9ii7HHlrc2FkPa7topXnGlsxRFuEwTMGmrUg2ssdiNzsU=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57825

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690216	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	No	No	No	No
2020300690217	MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA	No	No	No	No
2020300690218	MEJORAMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICO "CASA DE LA CULTURA GUTIERREZ ZAMORA"	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

oPczqPXDa3oYdpyUEJs/cYWpeakc6zAeo4P1MKBDtulP+qTz2scl+ajNvpaVl1yHHR6EUX/vARCpqP31ckcFf5n19B83muNplL/jvyNDTTvLCXLvNj5vOviP14EGmVLIaBy12N5eqAQUWUV2Ai/MaU0cxNocE9LAFxwHcG+OWQ=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57930

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	Sí	No	Sí	No
2019300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57930



AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCIÓN
MUNICIPAL DE
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

ONau2otO2SnJCU n543b007f2qUn+CcmndhrQaOhDghzsnzVIOUCBKL7h2y6GqIpx8JaLodKM9RBApx8WGOBWqsxVcfO3rS9uprATrGwpc550vXJ9XWI2I2Cd34JCy70pB3tyzIMMctZkNKPndautvbnUel6dg068raCr7gWkM=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57931

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57931



SELLO DIGITAL:

CihzGZlw0ii3+v+Khn0hMiNQHY8fQ7EssmpOsmexXQMoRVXyc5D7IHOaggQ5aVW68xEI44t32Kb6ATRAFkgZ5EPIGkqSEb0MP+ieHd9dBi3u4+Bg8gF8sx5TVHIVBH6H32uLyf6LWklQwxPOVlygjqpMe1AC1n/YsaLfl3112rs=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57929

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690500	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS	No	No	No	No
2020300690501	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON , COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+ 353 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2020300690505	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2020300690506	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

VBiuQtc1dylxoDuMNTL1zRw1icBLQSPvu5Rs3e+Lspgha33ztB80t+1ejDZUI4OxfaTqeHHd0swpkTMV55WbdEtt2Hvz4RI4CcytNk0XfQ0ee4BzabVrgDSllwl4qteeFFIbzGsKU4Nyw25B42ifbz+DZkbdgXjzOAogLAg3+Qc=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57929

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690507	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690508	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2020300690509	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57929




SELLO DIGITAL:

VBiuQtc1dyLxoDuMNTL1zRw1lcBLQSPvu5Rs3e+Lspgha33ztB80t+1ejDZUI4OxfaTqeHHd0swpkTMV55WbdEtz2Hvz4RI4CcytNk0XfQ0ee4BzabVrgDSllwl4qteeFFibzGsKU4Nyw25B42ifbz+DZkbdgXjzOAogLAg3+Qc=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57932

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+145 AL 1+713	No	No	No	No
2020300690601	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0096, COLONIA CUAUHEMOC Y SAN	Sí	No	No	No
2020300690602	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 109, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL CARMEN, HERNÁNDEZ OCHOA Y MURILLO VIDAL	Sí	No	No	No
2020300690603	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0151, COLONIA HIDALGO, ANCLON Y	Sí	No	No	No
2020300690604	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690605	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	Sí	No	No	No
2020300690606	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0202, COLONIA PRIMERO DE MAYO.	Sí	No	No	No
2020300690607	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y GUADALUPE	Sí	No	No	No
2020300690608	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA	No	No	No	No
2020300690609	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	Sí	No	No	No
2020300690610	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS	Sí	No	No	No
2020300690611	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	Sí	No	No	No



SELLO DIGITAL:

RpuV8kchXVlHQxtx9EGGa3UoqF4f+wiYR4OU3mKy9WHTED0u+njNNlv6aF9/IFSgU/epw4K1Dloy6ummZrYme6Hh4+Xz5eYD5am6kvcsmK+Bm3FrolJc3aoUOd0OyY3uFz9P7Df8kCAiQvRgkDgEE0nKO7gNu2l6frpqomy3Xq0=





Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57932

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690612	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL	Sí	No	No	No
2020300690613	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA.	Sí	No	No	No
2020300690614	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA.	Sí	No	No	No
2020300690615	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE ARROYO GRANDE	Sí	No	No	No
2020300690616	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO	Sí	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57932



X

SELLO DIGITAL:

RpuV8kchXViHQxtx9EGGa3UoqF4f+wiYR4OU3mKy9WHTED0u+njNNIv6aF9/IFsgU/epw4K1Dloy6ummZrYme6Hh4+Xz5eYD5am6kvcsmK+Bm3FrolJc3aoUOd0OyY3uFz9P7Df8kCAIQvRgkDgEE0nKO7gNu2I6frpqomy3Xq0=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57943

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690700	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS CORONADO DEL KM 0+584 AL 0+927	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57943



SELLO DIGITAL:

n3HJbwCctFofotnvtO7/ljr9oA041PkgCi/20pGZR4sfS7UfUaFtoRI+mhiWnK5ppwAoU+CUSPIFUanRjnbEFXx51g9Selrq15L0in3lYBQlVdJLaj+JheLetMr1O8gQprPKfSHiaQM2Q6iOP6bUW5U0MKIs8yFbfGdCEA27Uxg=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57828

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690800	CONSTRUCCIÓN DE FORO CÍVICO EN CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57828



SELLO DIGITAL:

ki6MuZXkQsv1vC9f28aP0F5Rqbd/+wngTSDoG/y53Jnw4I07EInDil7hdpj7I8tHPy/bUTzlvFvZXN+VsixQPbPJ4Wl8UVzBjtgRZNLWYmnKRVwmLi1XDTKuAblhud/W0s2tgQyjjqJ0GR+K7aOPfwJ+fPkgRUCgsRgr0Qs4TEA=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57829

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690850	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA Y PLAZOLETA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

G2nKn/gWjXksA951SR+XH7h5LDLFIlfzQI4O7QiepjgDauN/xQQiT7WqGvwiYAKQFszjCxAnmBoTLgD9MMNNrbw8F81IwV98ahFCDwW1LFRbBCAgPKIRc71T1oTZrJjQ7yFWcjNdMoeloXNXqPYMIP+D3ks9Pv9R4FIG2Bm8cg=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57830

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690900	REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/57830



SELLO DIGITAL:

MKTiyH5bkOb4APiy3T3pUMyKhU+ZaamAln0xoO/n+zil/Cj5bllYBZqwmPc/jwFulC9LkRSY7PfAw2EexdiG/lvNik66Z/b5UamWzJOUoVk0E2QkiEvRSx7POOoDMcmPc8sUuH18MgTUkoAqkeQTDFFQXoSzy8sBcE13An2Z1c=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690101	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	3.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINO




 ALFREDO MORENO NERI
 Supervisor de obra Responsable
 INGENIERO
 Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA
No. de obra: 2020300690111 **Periodo:** MARZO
Descripción: AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2020
Número de estimación: 1.00
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA
Fecha de revisión: 24/04/2020

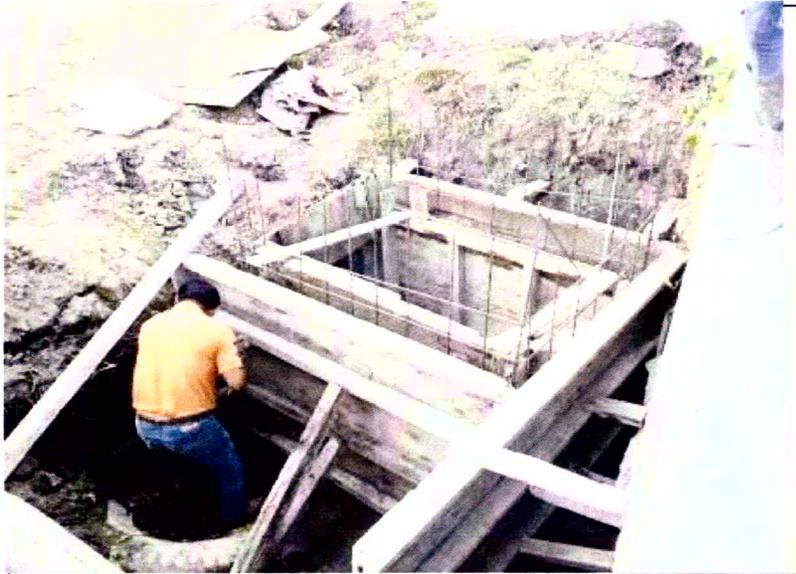

FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

PROCESO



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2019-2021
 C.O.P. S.
 P. PÚBLICA

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690116	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

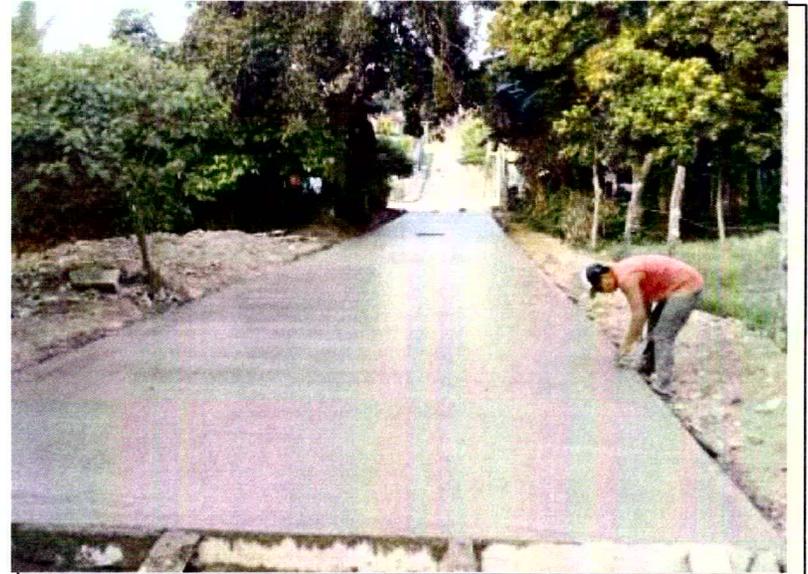

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL CEPILLO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2019300690451	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	8.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.			Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PU
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINO



ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690452	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	25/04/2020



FOTO INICIO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO TERMINADO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690601	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0096, COLONIA CUAUHEMOC Y SAN PANCHO			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690602	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 109, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL CARMEN, HERNÁNDEZ OCHOA Y MURILLO VIDAL			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2020
No. de obra: 2020300690603	Periodo: MARZO	Número de estimación: 1.00
Descripción: SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0151, COLONIA HIDALGO, ANCLON Y ARENAL.		Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES P/
		Fecha de revisión: 24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690605	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690606	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0202, COLONIA PRIMERO DE MAYO.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:


ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

Observaciones:

Empty box for observations.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690607	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y GUADALUPE			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO


Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS DE ARENA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690609	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




 LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
 Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
 Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690610	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:





FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENNIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690611	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




 NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

 INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690612	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690613	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690614	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	PAGUAS DE ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690615	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE ARROYO GRANDE			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty space for observations.



NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	PAGUAS DE CORONADO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690616	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	24/04/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:
24/04/2020
MES QUE SE REPORTA
MARZO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2020300690101		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
ANTECEDENTES:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO X	BAJO
			MUY BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.414042000	LONGITUD	-97.155953000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO; EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO; EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION 3	\$139,736.96	2	\$139,736.96	F5C20F12FG	\$140,341.88	\$0.00	\$604.92	\$0.00	\$139,736.96
ESTIMACION 1	\$1,501,500.00	1	\$1,501,500.00	3C3F55DFdf	\$1,508,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$1,501,500.00
ESTIMACION 2	\$231,000.00	2	\$231,000.00	E38AF6694	\$232,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$231,000.00
TOTALES	\$1,872,236.96		\$1,872,236.96		\$1,880,341.88	\$0.00	\$8,104.92	\$0.00	\$1,872,236.96

MONTO AUTORIZADO:	\$1,880,341.88	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,880,341.88	C/IVA		
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	licitación pública	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0101/OP-001	FECHA:	14/01/2020
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RFC:	RHC0411269Q3		
MONTO CONTRATADO:	\$1,880,341.88	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	15/01/2020	15/01/2020
	TERMINO	30/03/2020	14/02/2020
	DIAS	76	31
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$140,341.88	03/03/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,880,341.88	03/03/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$140,341.88	03/03/2020
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$162,098.44	\$188,034.19
AFIANZADORA:		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO	
No. DE FIANZA:		3900-03012-6	3900-03010-8
FECHA:		14/01/2020	13/02/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):		\$1,880,341.88	C/IVA

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:
25/04/2020
MES QUE SE REPORTA
MARZO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL CEPILLO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y	No. DE OBRA:	2019300690451		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X
			BAJO	MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.438964517	LONGITUD	-97.124880075	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO RALLADO, JUNTA DE DILATACION, CORTE DE PAVIMENTO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO RALLADO, JUNTA DE DILATACION, CORTE DE PAVIMENTO.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION 8 FI	\$137,360.78	8	\$137,360.78	4188	\$137,955.42	\$0.00	\$594.64	\$0.00	\$137,360.78
ESTIMACION 5	\$240,240.00	5	\$240,240.00	1072	\$241,280.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$240,240.00
ESTIMACION 1	\$963,963.00	1	\$963,963.00	909	\$968,136.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00	\$963,963.00
ESTIMACION 2	\$554,400.00	2	\$554,400.00	931	\$556,800.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$554,400.00
ESTIMACION 3	\$265,650.00	3	\$265,650.00	942	\$266,800.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$265,650.00
ESTIMACION 4	\$300,300.00	4	\$300,300.00	953	\$301,600.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$300,300.00
ESTIMACION 6	\$505,000.00	6	\$505,000.00	1261	\$507,186.15	\$0.00	\$2,186.15	\$0.00	\$505,000.00
ESTIMACION 7	\$518,000.01	7	\$518,000.01	D000409674	\$518,000.01	\$0.00	\$2,242.42	\$0.00	\$518,000.01
TOTALES	\$3,484,913.79		\$3,484,913.79		\$3,497,757.58	\$0.00	\$15,086.21	\$0.00	\$3,484,913.79

MONTO AUTORIZADO:	\$137,955.42	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$137,955.42	C/IVA		
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-CAPUFE 2019/0451/OP-001	FECHA:	02/07/2019
CONTRATISTA:	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA SA DE CV		
RFC:	EAP150625319		
MONTO CONTRATADO:	\$3,500,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/01/2020	03/07/2019
	TERMINO	31/03/2020	30/07/2019
	DIAS	61	28
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$137,955.42	02/03/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$3,500,000.00	02/03/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$137,955.42	02/03/2020
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$301,724.14	\$350,000.00
AFIANZADORA:		FIANZAS MONTERREY, S DE CV	
No. DE FIANZA:		19786920	19787062
FECHA:		02/07/2019	30/07/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$3,500,000.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:
25/04/2020
MES QUE SE REPORTA
MARZO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MEXICO Y PERU ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	No. DE OBRA:	2020300690452		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	ANTECEDENTES:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD	20.445817600	LONGITUD	-97.095526460						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO RALLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO RALLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ACION UNO FINI	\$740,548.26	1	\$740,548.26	CCDD1523	\$743,754.10	\$0.00	\$3,205.84	\$0.00	\$740,548.26
TOTALES	\$740,548.26		\$740,548.26		\$743,754.10	\$0.00	\$3,205.84	\$0.00	\$740,548.26

MONTO AUTORIZADO:	\$743,742.29	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$743,742.29	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-CAPUFE2019/0452/OP-008	FECHA:	26/12/2019
CONTRATISTA:	RICANO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RFC:	RHC0411269Q3		
MONTO CONTRATADO:	\$743,742.29	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	18/02/2020	01/01/2020
	TÉRMINO	31/03/2020	29/01/2020
	DÍAS	0	29
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$743,742.29	04/03/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$743,742.29	04/03/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$74,035.00	\$85,880.84	
AFIANZADORA:	Rta, S.A. de C.V., Grupo Rta, S.A. de C.V., Grupo		
No. DE FIANZA:	3900-02992-2	3900-03040-5	
FECHA:	26/12/2019	29/01/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$743,742.29	C/IVA	

OBSERVACIONES:

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57942

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:00:58 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Y6mYVU6bCY7aNX9RE0RMJy5+vNe/wLL7009qnIYy97O2u1s1r5SQ7aDJvsyVqcfG8isBkb8Ga3gC3tWeZ
0ewmMrbcqRZg740vrNa5JqddMLoezFuyXVYhFwcOhJuzY9ii7HHLrc2FkPa7topXnGlsxRFuEwTMGmrUg2
ssdiNzsU=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57930

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:06:32 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ONau2otO2SnJcUnS43bO07f2qUn+CcmndhrQaOhDghzsnzViOUCBKL7h2y6GqIpx8jaLodKM9RBAPx8W
GQBWqsxVcfO3rS9uprATrGwpcc5S0vXJ9XWI2I2Cd34JCy70pB3tyzIMMCtZkNKPndsautebnUel6dg068ra
Cr7gWkM=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57931

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:09:12 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

CihzGZlw0il3+v+Khn0hMiNQHY8fQ7EssmpOsmexXQMoRVXyc5D7IHOAggQ5aVW68xEI44t32Kb6ATRAFkgZ5EPIGKqSEb0MP+ieHd9dBi3u4+Bg8gF8sx5TVHIVBH6H32uLyf6LWklQwxP0VLYgjqpMe1AC1n/YsaLfL3112rs=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57932

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:13:34 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

RpuV8kchXViHQxtx9EGGa3UoqF4f+wiYR4OU3mKy9WHTEd0u+njNNlv6aF9/IFSgU/epw4K1Dloy6ummZrYme6Hh4+Xz5eYD5am6kvcsmk+Bm3FroJc3aoUOd0OyY3uFz9P7Df8kCAiQvRgkDgEE0nKO7gNu2l6frp qomy3Xq0=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57929

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:18:14 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

VBiuQtc1dyLxoDuMNTL1zRw1lcBLQSPvu5Rs3e+Lspgha33ztB80t+1ejDZUI4OxfaTqeHHd0swpkTMV55WbdEtz2Hvz4RI4CcytNk0XfQ0ee4BzabVrgDSllwl4qteeFFIbzGsKU4Nyw25B42ifbz+DZkbgXjzOAogLAg3+Qc=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57825

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:19:45 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

oPcqPXDa3oYdpyUEJs/cYWpeakc6zAeo4P1MKBDtuIP+qTz2scl+ajnvpaVI1yHHR6EUX/vARCpqP31ckcFf5n19B83muNpIL/jvyNDTTvILCXLvNj5vOviP14EGmVLlaBy12N5eqAQUWUV2Ai/MaU0cxNocE9LAFXwHcG+OWQ=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57943

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:21:16 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

n3HJbwCctFofotnvtO7/ljr9oA041PkgCi/20pGZR4sfS7UfUaFtoRI+mhiWnK5ppwAoU+CUSPIFUanRJnbEFX
x51g9Selrq15L0in3IYBQlvDjLaj+JheLetMr1O8gQprPKfSHiaQM2Q6iOP6bUW5U0MKIs8yFbfGdCEA27Ux
g=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57828

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:22:36 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ki6MuZXkQsv1vC9f28aP0F5Rqbd/+wngTSDoG/y53Jnw4l07ElnDil7hdpj7l8tHPy/bUTzlvFvZXN+VsixQPbPJ4Wl8UVzBjtgRZNLWYmnKRVwmLi1XDTKuAbIhud/W0s2tgQyjqj0GR+K7aOPfwJ+fPkgRUCgsRgr0Qs4TEA=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57829

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:24:21 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

G2nKn/gWjXksA951SR+XH7h5LDLFIlfzQI4O7QiepjigDauN/xQQiT7WqGvwiYAKQFszjCxAnmBoTLgD9M
MNNrbw8F81IWW98ahFCDwW1LFRbBCAgPKIRc71T1oTZrjQ7yFWcjNdMoeloXNXqPYMIP+D3ks9Pv9R
4FIG2Bm8cg=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57830

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:25:45 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

MKTiyH5bkOb4APiy3T3pUMyKhU+ZaamAln0xoO/n+zil/Cj5bIIYBZqwmPc/jwFulC9LkRSY7PfAw2EexdiG/lvNlk66Z/b5UamWzJOUoVvk0E2QkiEvRSx7POOoDMcmPc8sUuH18MgTUkoAqkeQTDFFQXoSzy8sBcEI3An2Z1c=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /57824

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2020 09:26:57 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

VoqApNep1xMs/yFMnToRHbAjR3Iz7o1GeeJmSMIK4cWQnmOXEAstLFqrcDaFA9XJH9LvLzzB+U+9pVb
XG6nNO56LmX6fU/zjgw1aWei6cHPnhg1TT1+N8L3+FIPZdr1YUWSE3r07nCEYf9msRTVQ/ObpDllooOUK
CD4DIMXWDA=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

PERIODO: ABRIL 2020

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/2020 AL 30/04/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	25/04/2020	21:45:09
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	25/04/2020	21:46:27
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/04/2020	21:47:11
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	25/04/2020	21:48:35
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	25/04/2020	21:49:52
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
